

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

2ª IGE

Órgão / entidade	Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO
Data da 2ª visita	01/12/2005
Contrato selecionado	Contrato nº 07/2005 – Obras de contenção de encosta, demolição e fixação de blocos de rocha, na Avenida Menezes Cortes na altura dos postes 7777/97, 7777/99 e 7777/119 – Lins de Vasconcelos – XIII R.A. – AP-3.1
Critérios da seleção	Relevância da obra.
Equipe	Jussara Teixeira Peres Técnico de Controle Externo Matrícula – 40/900.170 Marcio Sousa Bandeira de Melo Engenheiro Matrícula – 40/901.375

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ANEXOS

1. Cronograma atualizado;
2. Cópia das medições;
3. Ofício de apresentação.

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 01/12/2005

CONTRATO Nº: 07/2005

OBJETO: Obras de contenção de encosta, demolição e fixação de blocos de rocha na Avenida Menezes Cortes na altura dos postes 7777/97, 7777/99 e 7777/119 – Lins de Vasconcelos – XIII R.A. – AP-3.1.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TP 04/2005

TCMRJ Nº: 40/ 2500/2005

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/100. 352/2005

PRAZO TOTAL: 210 dias corridos

DATA DE INÍCIO: 01/06/2005

PREVISÃO DE TÉRMINO: 27/12/2005

PRAZO RESTANTE: 131 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 624.031,94

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON CONTRATOS): R\$ 188.101,01

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R\$	%
3ª	3ª normal	31/07/2005 a 29/08/2005	62.732,45	10,05
4ª	4ª normal	30/08/2005 a 28/09/2005	89.123,80	14,28
5ª	5ª normal	29/09/2005 a 28/10/2005	128.845,12	20,53
Total acumulado (todas as medições)			406,069,93	65,07

FISCAIS DA OBRA: Antonio Carlos Guedes
Matrícula: 56/1.590.066-7
Telefone da Secretaria: 2589-5757 R 237

Geraldo Luiz Gomes
Matrícula: 56/1.590.079-0

SITUAÇÃO: Contrato (040/002500/2005) – Em tramitação

Resultados obtidos:

a) Retrospectiva da(s) visita(s) anterior(es)

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

1ª Visita: Abrangência: 1ª a 2ª medições

- Medições até a data da vista correspondem a R\$ 125.368,56 (20,09%);

b) **2ª Visita:** Abrangência: 3ª a 5ª medições.

b.1) Atualização dos locais cujas obras não estavam concluídas



Figura 1 – Visão geral: à esquerda, parte da cortina ancorada; ao centro, contrafortes em execução; à direita, talude a ser revestido.

Figura 2 – Serviços concluídos

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

1ª visita



Figura 3 – Trecho do talude a ser revestido em concreto projetado.

2ª visita



Figura 4 – Serviços concluídos

1ª visita



Figura 5 – Contrafortes em execução.

2ª visita



Figura 6 – Serviços concluídos

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

1ª visita



Figura 7 – Cortina ancorada em execução.

2ª visita



Figura 8 – Serviços concluídos

1ª visita



Figura 9 – Talude a ser revestido com concreto projetado.

2ª visita



Figura 10 – Serviços concluídos

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

1ª visita

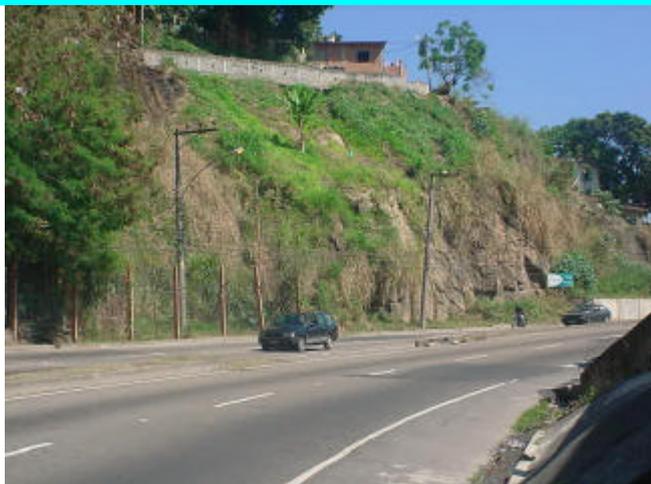


Figura 11 – Vista geral da área próxima ao poste 7777/119 onde os serviços não foram iniciados.

2ª visita



Figura 12– Vista geral da área próxima ao poste 7777/119 com os serviços iniciados.

b.2) Serviços registrados durante a 2ª visita.



Figura 13 – Muro de concreto armado em execução próximo ao poste 7777/119.



Figura 14– Contraforte em execução próximo ao poste 7777/119.

SCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Figura 15 – Capina e retirada de entulho da área próxima ao poste 7777/119



Figura 16– Perfuração para ancoragem do muro (cortina atirantada) próxima ao poste 7777/119.

Observações:

A presente visita abrangeu 3 medições que correspondem a R\$ 280.701,37 (duzentos e oitenta mil, setecentos e um reais e trinta e sete centavos), resultando em um valor total de R\$ 406.069,93 (quatrocentos e seis mil, sessenta e nove reais e noventa e três centavos), que perfaz 65,07% contratado.

Conclusão:

Diante do exposto e não se verificando impropriedades nestas etapas da obra, somos pelo arquivamento da 2ª visita e considerando que restam 34,93% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita a obra.

2ª IGE, 08 de dezembro de 2005.

Márcio Sousa Bandeira de Melo

Engenheiro

40/901.375

Jussara Teixeira Peres

Técnico de Controle Externo

40/900.170
